AA KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ

Askeri Araçlar Kaynak Yönetimi Sistemi

Kullanıcı Manueli ve Yetki Matrisi

İçindekiler


1. Giriş ve ekran düzeni
2. Roller
3. Gerçekleşen Kaynak Dağılımı ve kişisel takvim
4. Aylık Aktivite Raporu
5. Planlanan Kaynak Dağılımı
6. Projeler ve Kritik Proje Konuları
7. Proje görüntüleme yetkisi
8. Kaynak Planlama Raporları ve Head Count
9. Organizasyon, çalışan ve hesap yönetimi
10. Yetki matrisi
11. Sık karşılaşılan durumlar ve sözlük

Belge sürümü	2.0
Tarih	16.10.2026
Uygulama durumu	main dalı, commit 76934c5
Ekran görüntüleri	Kurgusal test verisiyle alınmıştır; gerçek kişi veya proje bilgisi içermez.

1. Giriş ve ekran düzeni

Sisteme giriş


1. Uygulama adresini tarayıcıda açın. **Kullanıcı Adı** ve **Şifre** alanlarını doldurup **Giriş Yap** düğmesine basın.
2. Active Directory hesabı kullanıyorsanız kurum şifrenizle girersiniz; hesabınıza ayrıca uygulama yetkisi tanımlanmış olmalıdır.
3. Sağ üstte kullanıcı adınızı ve rolünüzü kontrol edin. İşiniz bitince **Çıkış** düğmesini kullanın.



Giriş ekranı

Ekranın bölümleri

- **Üst bar:** Sistem adı, kullanıcı menüsü ve **Çıkış**. Kullanıcı menüsünden **Varsayılan sekme** seçilir (bu tarayıcıda sonraki girişte açılacak ekran). Admin bu menüde ayrıca **Veri Yedeği İndir** ve **Yedek Yükle** işlemlerini görür.
- **Sekmeler:** Gruplar halinde dizilir ve ince çizgilerle ayrılır: gerçekleşen ve aktivite · planlama ve projeler · raporlar · yönetim. Her kullanıcı yalnız rolünün izin verdiği sekmeleri görür.
- **Araç satırı: Görünüm** (Ayrıntılı, Kompakt, 5 Yıllık Genel Bakış), ekrana özel düğmeler ve **Excel'e Aktar** / **Proje Raporunu İndir** / **Kaynak Raporu İndir**.
- **Filtreler:** Liderlik, Takım, Proje, Kişi, Başlangıç Ayı ve Görünür Dönem. **Filtreleri Sıfırla** varsayılana döndürür. Filtre yalnız görünümü daraltır, yetki vermez.
- **Sadece veri olanlar:** Planlanan ve gerçekleşen tablolarda boş/0 satırları gizler. Her açılışta **kapalı** başlar.
- **Bildirimler:** "Veritabanına kaydedildi", "N kayıt birlikte kaydedildi", "Filtre uygulandı" gibi mesajlar sağ altta birkaç saniye görünüp kaybolur; tabloyu kaydırmaz. Hata mesajları ise ekranda kalır.

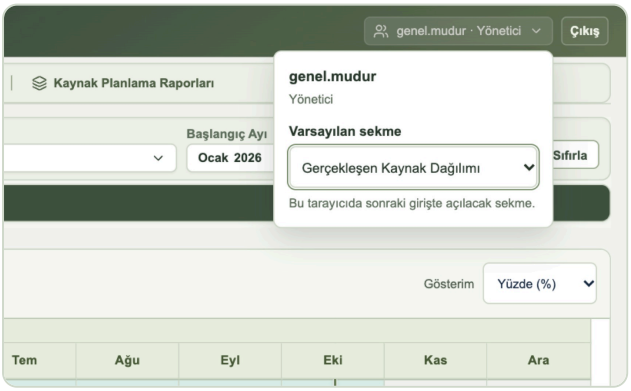

Kullanıcı menüsü: rol bilgisi ve varsayılan sekme seçimi

2. Roller

Her hesabın tek bir uygulama rolü vardır. Rol, hangi ekranların görüneceğini ve hangi kayıtların değiştirilebileceğini belirler. Ayrıntılı karşılaştırma 10. bölümdeki yetki matrisindedir.

Admin

Tüm ekranları ve tüm verileri görür, tümünü düzenler. Çalışan, hesap, rol, organizasyon, ortak çalışma takvimi, veri yükleme, değişiklik geçmişi ve yedekleme işlemleri yalnız Admin'e aittir.

Yönetici


Planlanan dağılımda tüm takımları görür, yalnız kendisine verilen liderlik veya takım kapsamında giriş yapar. Yetkili liderliklerindeki çalışanların gerçekleşen dağılımını düzenler. Projeleri, kritik konuları ve raporları görüntüler.

Normal Kullanıcı

Kendi gerçekleşen dağılımını ve kişisel izin/eğitim takvimini girer. Kendi takımının aylık aktivitesini ve kendisine görünür projeleri görüntüler.

Normal-Proje

Yalnız **Mühendislik Liderliği Projeler** ve **Kritik Proje Konuları** ekranlarını görür. Bu iki ekranda Admin ile aynı yetkilere sahiptir: proje ekler, düzenler, siler, sıralar; aşama, başlık, not, milestone ve kritik konuları yönetir; proje görüntüleme yetkisini belirler. Tüm projeleri görür.

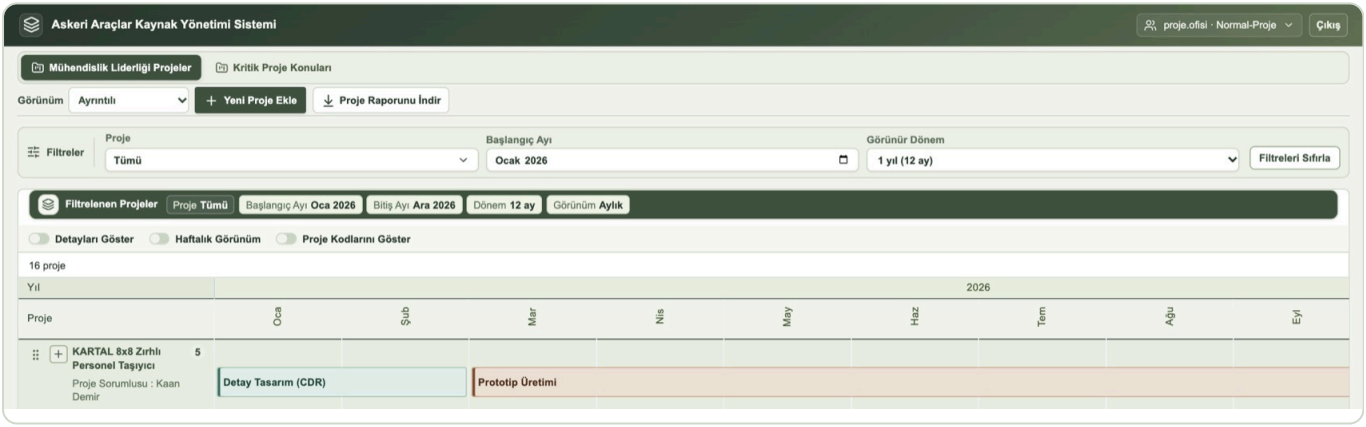

Normal-Proje rolündeki kullanıcı yalnız iki sekme görür; **Yeni Proje Ekle** düğmesi açıktır.


> **Kaynak rolü ile uygulama rolü farklıdır.** Çalışan kaydındaki Lider, Product Owner, Team Member veya CoE bilgisi organizasyondaki görevi gösterir; kendiliğinden uygulama yetkisi vermez. Uygulama rolü, çalışan formundaki **Hesap ve Yetkiler** bölümünden ayrıca atanır.

Yönetici yetki kapsamı

- **Liderlik yetkisi:** Seçilen liderlik ve altındaki tüm liderlik/takımlar için planlanan dağılım girişi ve bu birimlerdeki çalışanların gerçekleşen dağılımı.
- **Takım yetkisi:** Yalnız seçilen takım için planlanan dağılım girişi. Takım yetkisi, o takımdaki çalışanların gerçekleşen dağılımını düzenleme hakkı vermez.
- Yönetici, başka bir çalışanın kişisel izin/eğitim takvimini görüntüleyemez ve değiştiremez.

3. Gerçekleşen Kaynak Dağılımı ve kişisel takvim

Çalışanların projelere fiilen ayırdığı süre aylık olarak bu ekranda girilir. Satırlar proje altında kişi bazındadır; proje satırında o dönemin aşamaları görünür.

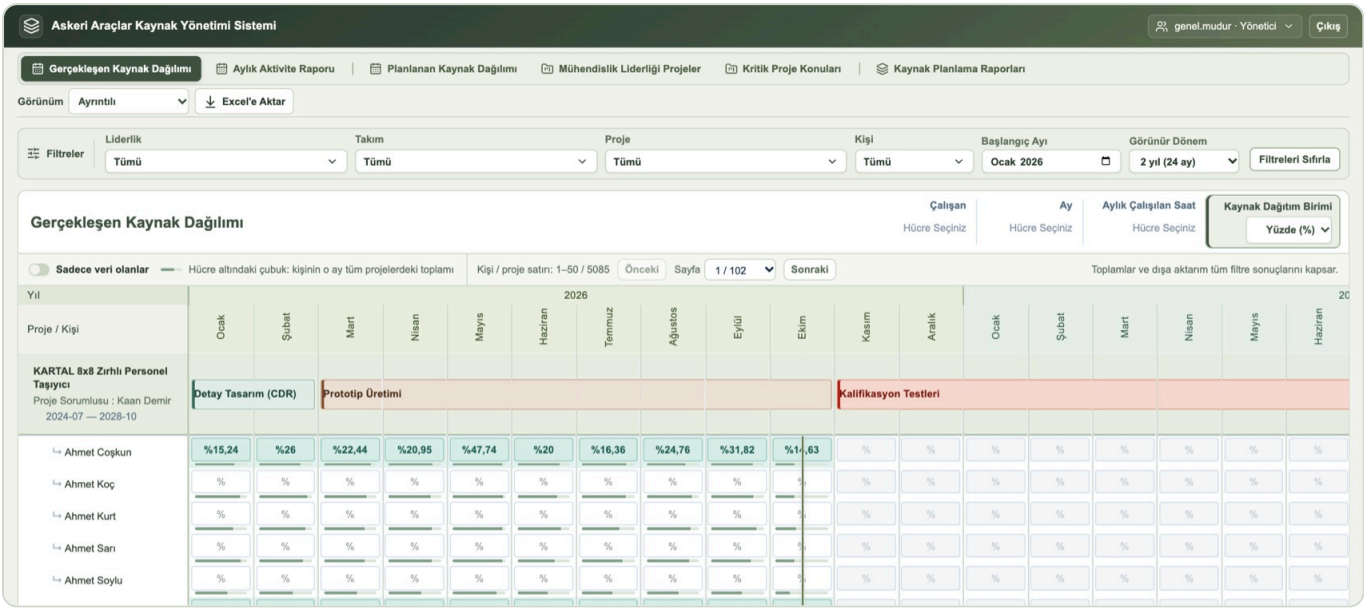

Gerçekleşen Kaynak Dağılımı (Yönetici görünümü). Hücre altındaki çubuk, kişinin o ay tüm projelerdeki toplamını gösterir.

Aylık süre girme


1. Filtrelerden kişi, proje ve dönemi seçin. **Kaynak Dağıtım Birimi** alanından **Yüzde (%)** veya **Saat** seçin.
2. İlgili ay hücresine değeri yazın; Enter'a basın veya hücreden çıkın. Kayıt sonucu sağ altta kısa bir bildirimle görünür.
3. Hücre değerini ve hücre altındaki aylık toplam çubuğunu kontrol edin. Hücre seçildiğinde sağ üstte çalışan, ay ve aylık çalışılan saat bilgisi görünür.

> Giriş yalnız içinde bulunulan ay ve geçmiş aylar için, proje dönemi içinde yapılabilir. Proje süreleri ile eğitim toplamı kişinin net aylık kapasitesini aşamaz. Normal Kullanıcı tabloda yalnız kendi satırlarını görür.

Ortak çalışma takvimi (yalnız Admin)

Araç satırındaki **Çalışma Takvimi** düğmesiyle resmî tatil ve çalışma dışı günler tanımlanır; değişiklikler **Takvimi Kaydet** ile kalıcı olur. Ortak takvimde başlangıç ve bitiş günleri dahildir.

Kişisel izin ve eğitim takvimi

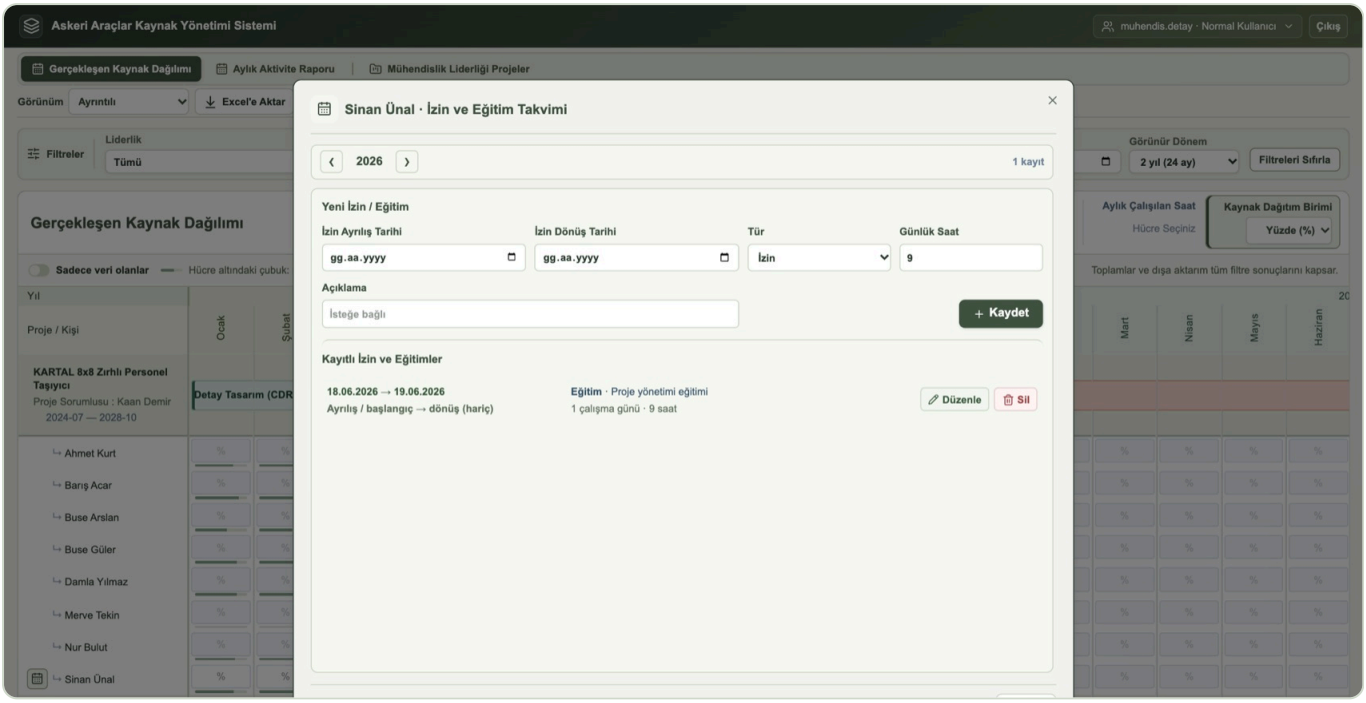

Çalışan adının solundaki takvim simgesiyle açılan İzin ve Eğitim Takvimi.


1. Gerçekleşen tablosunda çalışan adının solundaki takvim simgesine tıklayın. Üstteki oklarla yıl değiştirilebilir.
2. **Yeni İzin / Eğitim** bölümünde **İzin Ayrılış Tarihi**, **İzin Dönüş Tarihi**, **Tür** (İzin veya Eğitim) ve **Günlük Saat** girin; isterseniz **Açıklama** ekleyin. **Kaydet**.
3. Kayıt **Kayıtlı İzin ve Eğitimler** listesinde görünür. **Düzenle** ile değiştirin, **Sil** ile kaldırın. **Kapat** ile pencereden çıkın.

> **Dönüş günü hesaba katılmaz.** 12 Ekim ayrılış, 15 Ekim dönüş için 12, 13 ve 14 Ekim değerlendirilir. Hafta sonları ve tatiller atlanır. İzin çalışma saatinden düşer; eğitim dağıtılan süreye eklenir. Günlük saat 0,5–9 aralığındadır; aynı gündeki izin ve eğitim toplamı 9 saati aşamaz.

Kişisel takvimi yalnız çalışanın kendisi ve Admin görür ve düzenler. Yönetici, ekibindeki çalışanların takvimini açamaz.

4. Aylık Aktivite Raporu

Çalışanların seçili dönemdeki aylık faaliyet toplamlarını gösterir; yalnız görüntüleme içindir. Düzeltmeler gerçekleşen dağılım ekranında veya kişisel takvimde yapılır.

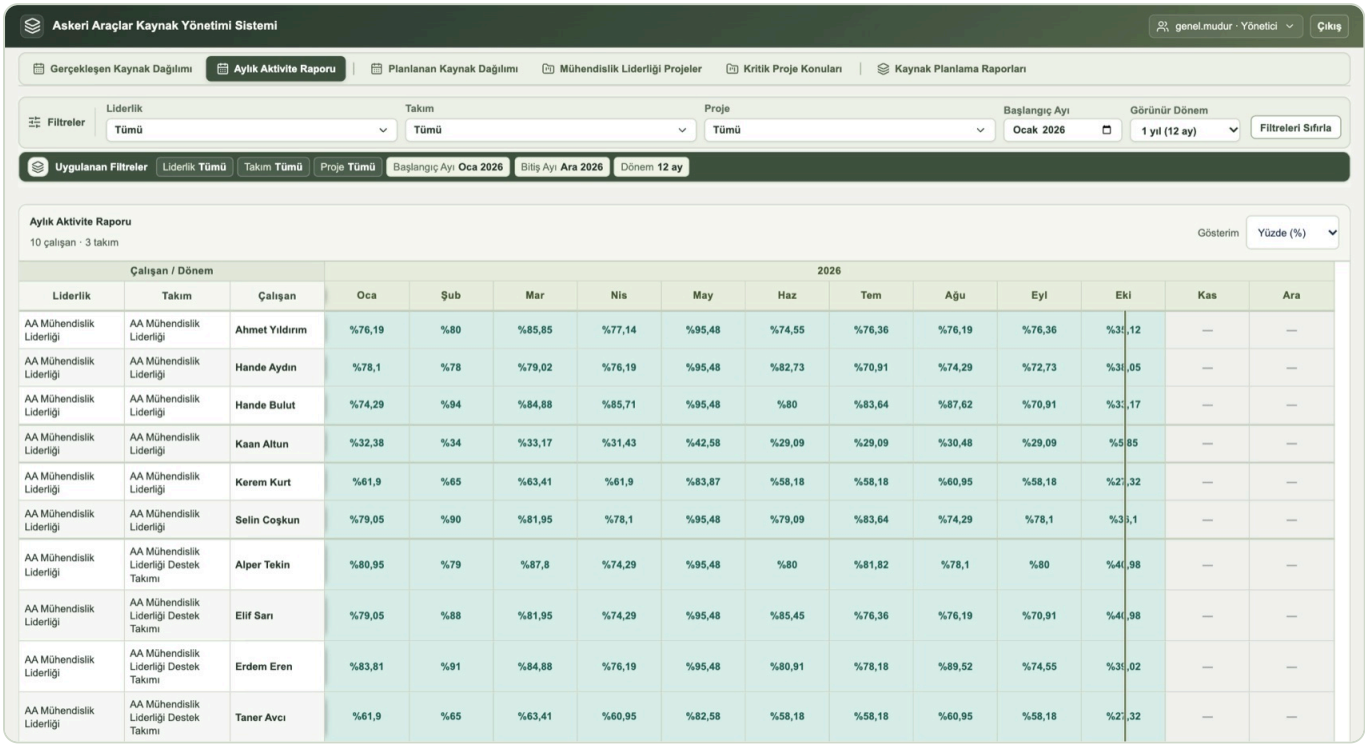


Çalışan / Dönem			2026											
Liderlik	Takım	Çalışan	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği	Ahmet Yıldırım	%76,19	%80	%85,85	%77,14	%95,48	%74,55	%76,36	%76,19	%76,36	%3 ,12	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği	Hande Aydın	%78,1	%78	%79,02	%76,19	%95,48	%82,73	%70,91	%74,29	%72,73	%3 ,05	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği	Hande Bulut	%74,29	%94	%84,88	%85,71	%95,48	%80	%83,64	%87,62	%70,91	%3 ,17	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği	Kaan Altun	%32,38	%34	%33,17	%31,43	%42,58	%29,09	%29,09	%30,48	%29,09	%5 85	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği	Kerem Kurt	%61,9	%65	%63,41	%61,9	%83,87	%58,18	%58,18	%60,95	%58,18	%2 ,32	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği	Selin Coşkun	%79,05	%90	%81,95	%78,1	%95,48	%79,09	%83,64	%74,29	%78,1	%3 ,1	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği Destek Takımı	Alper Tekin	%80,95	%79	%87,8	%74,29	%95,48	%80	%81,82	%78,1	%80	%4 ,98	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği Destek Takımı	Elif Sarı	%79,05	%88	%81,95	%74,29	%95,48	%85,45	%76,36	%76,19	%70,91	%4 ,98	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği Destek Takımı	Erdem Eren	%83,81	%91	%84,88	%76,19	%95,48	%80,91	%78,18	%89,52	%74,55	%3 ,02	—	—
AA Mühendislik Liderliği	AA Mühendislik Liderliği Destek Takımı	Taner Avcı	%61,9	%65	%63,41	%60,95	%82,58	%58,18	%58,18	%60,95	%58,18	%2 ,32	—	—

Aylık Aktivite Raporu: liderlik, takım ve çalışan bazında aylık toplamlar.

- Filtrelerden liderlik, takım, proje ve dönemi seçin; **Gösterim** alanından birimi (Yüzde veya Saat) belirleyin.
- Değerler seçili projelerde girilen aktiviteler ile eğitimin toplamıdır. Yüzde hesabında izin ve çalışma takvimi sonrası kalan çalışma saati kullanılır.
- İşbaşı öncesi ve işten ayrılış sonrası aylar ayrı renkle işaretlenir. İlanlar bu raporda gösterilmez.
- **Kapsam:** Admin tümünü, Yönetici kendi liderliğini ve alt liderliklerini, Normal Kullanıcı kendi takımını görür. Başka bir çalışanın satırını görmek, düzenleme yetkisi vermez.

5. Planlanan Kaynak Dağılımı

Admin ve Yönetici içindir. Değerler kişi bazında değil, takım veya liderlik kaynağı için **kişi eşdeğeri** olarak girilir (0,5 = yarım kaynak).

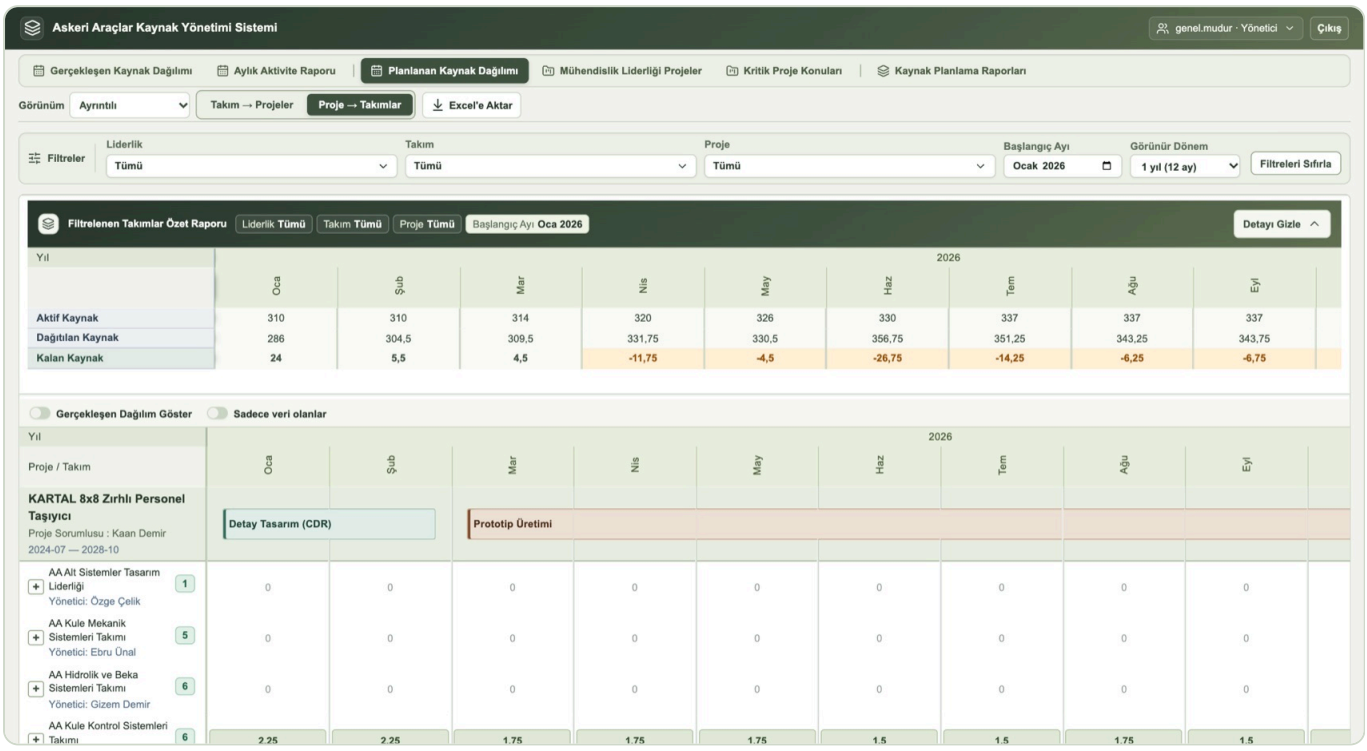

Üstte filtrelenen takımların Aktif / Dağıtılan / Kalan Kaynak özeti; altta proje bazlı takım dağılımı.

Kaynak planlama

1. Görünüm olarak **Takım → Projeler** veya **Proje → Takımlar** seçin; filtreleri belirleyin.
2. Yetkili olduğunuz ay hücresine değeri yazıp Enter'a basın. Yetkisiz veya proje dönemi dışındaki hücreler kilitlidir.
3. Özetteki **Kalan Kaynak** değerini kontrol edin; negatif değer kaynak açığıdır ve renkli gösterilir. Özet, **Detayı Gizle** ile kapatılabilir.

Hızlı giriş


İşlem	Yöntem
Birden fazla hücre seçmek	Fareyi basılı tutup sürükleyin; Ctrl ile seçime ekleyin.
Seçime aynı değeri yazmak	Değeri yazıp Ctrl+Enter.
Kopyala / yapıştır	Ctrl+C / Ctrl+V veya sağ tık menüsü.
Seçimi kaldırmak	Esc veya tablo dışına tıklama.

Gerçekleşen Dağılım Göster açıldığında plan değerlerinin yanında gerçekleşen değerler de görünür.

> **Tüm Dağılımları Sıfırla** yalnız Admin'de görünür; ekran filtresinden bağımsız olarak tüm aylardaki planı temizler ve uygulama içinden geri alınamaz.

6. Projeler ve Kritik Proje Konuları

Projeleri tüm roller görüntüler (proje görüntüleme yetkisine tabi). Aşağıdaki düzenleme işlemleri **Admin** ve **Normal-Proje** içindir.

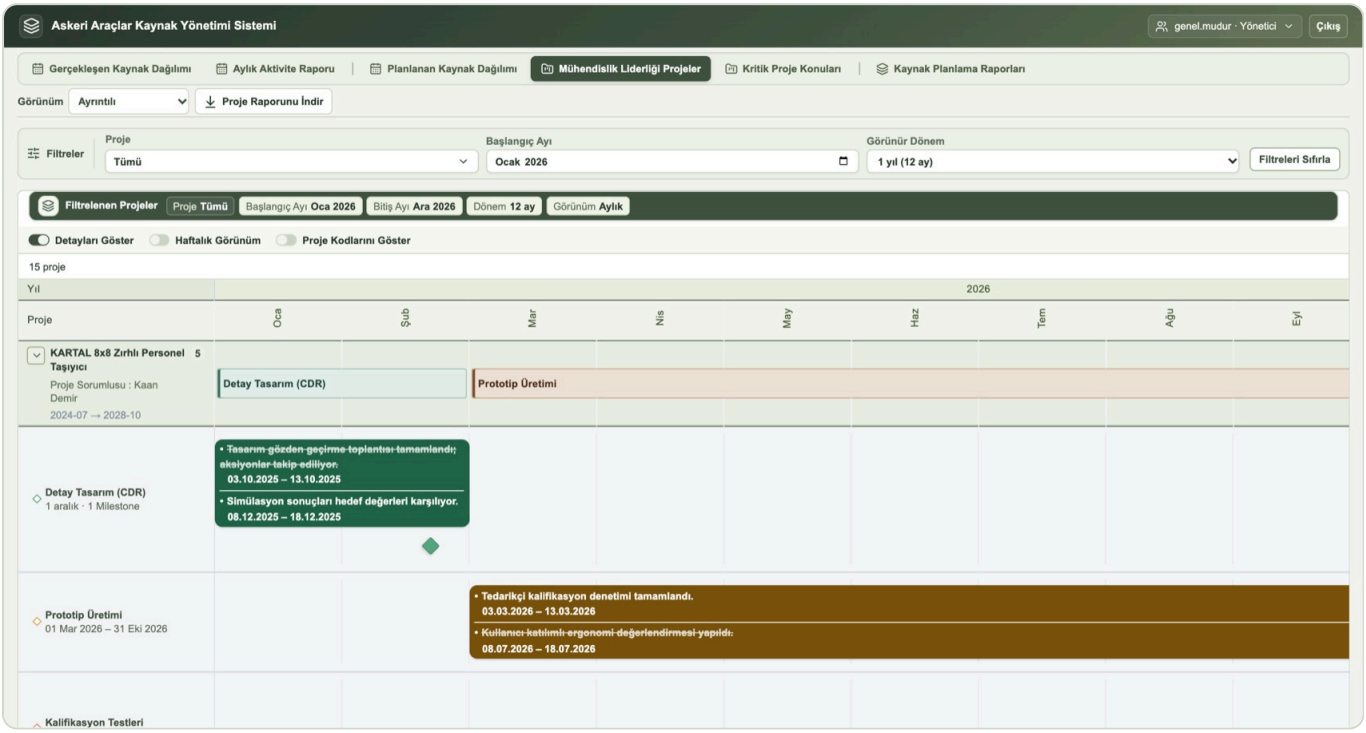

Detayları Göster açıkken aşamalar altında başlıklar, tarih aralıklı notlar ve milestone'lar (baklava) görünür. Üstü çizili notlar tamamlanmıştır.


Proje ekleme ve düzenleme

1. **Yeni Proje Ekle** ile proje adı, kodu, sorumlusu, başlangıç ve bitiş ayını girin. Gerekirse **Görüntüleme yetkisi** bölümünü doldurun (7. bölüm). **Kaydet**.
2. Var olan projeyi düzenlemek için proje adına tıklayın; **Proje Bilgilerini Düzenle** penceresi açılır. Projeler soldaki tutamaçla sürüklenerek veya Alt+ok tuşlarıyla sıralanır.
3. Aşama için ay kutusuna çift tıklayın; metin ve renk seçin. Renkler: Çelik Mavi, Petrol Yeşili, Kahverengi, Kırmızı, Petrol Mavisi, Sarı. Görünür dönemden önce başlamış aşamanın adı da dönemin başında gösterilir. Komşu aylar seçilip sağ tık menüsüyle aşama kopyalanabilir.
4. **Detayları Göster** açıkken **Başlık Ekle** ile başlık, tarih aralıklı not veya tek tarihli milestone ekleyin. Gerekli notlarda **Rapora Ekle** veya **Tamamlandı** seçin. Barı veya baklavayı sürükleyerek tarihi değiştirebilirsiniz.

Haftalık Görünüm aylık aşamayı haftalara yansıtır. **Proje Kodlarını Göster** açıksa proje Excel çıktısına kod sütunu eklenir.

> **Projeyi Sil**, projenin planlanan ve gerçekleşen dağılımlarını, aşamalarını ve bağlı konularını da kaldırır.

Kritik Proje Konuları

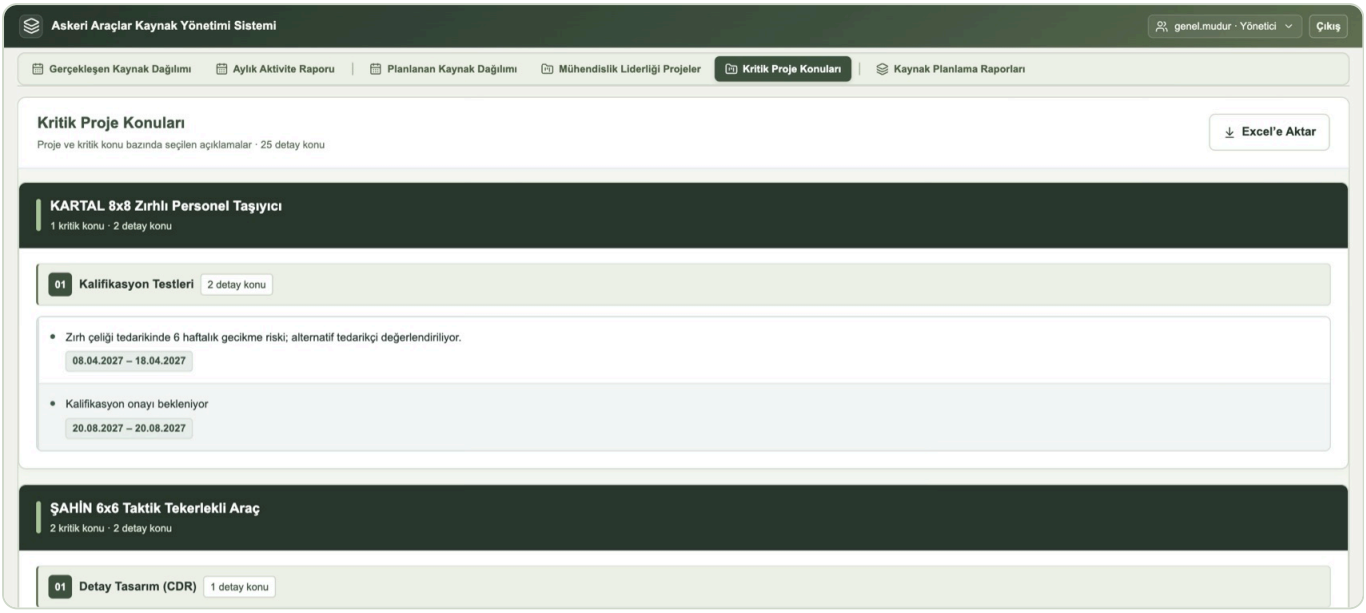


Rapora eklenen notlar proje ve başlık bazında gruplanır.

- Projelerde **Rapora Ekle** ile işaretlenen notlar burada proje ve başlık bazında listelenir.
- Admin ve Normal-Proje içerikleri düzenleyebilir; değişiklik proje ekranına da yansır.
- **Tamamlandı** notu yeşil ve üstü çizili gösterir; **Geri Al** işareti kaldırır. **Rapordan Çıkar** notu yalnız listeden çıkarır, silmez.
- Yönetici bu ekranı yalnız görüntüler; Normal Kullanıcı bu sekmeyi görmez.
- **Excel'e Aktar** gruplu listeyi tarihleriyle birlikte indirir.

7. Proje görüntüleme yetkisi

Her proje için kimlerin projeyi görebileceği, **Yeni Proje Ekle** ve **Proje Bilgilerini Düzenle** pencerelerindeki **Görüntüleme yetkisi** bölümünden belirlenir.

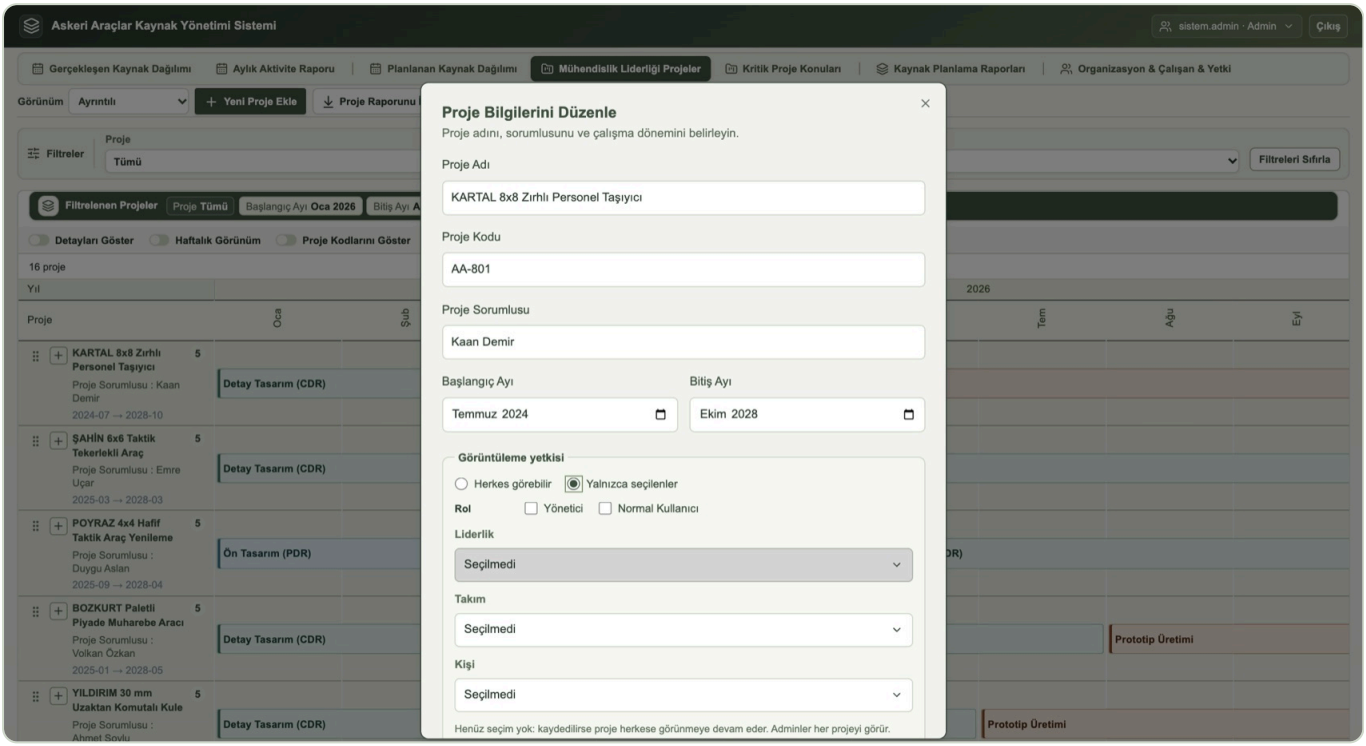

"Yalnızca seçilenler" seçildiğinde rol, liderlik, takım ve kişi kuralları tanımlanabilir.

Kurallar


- **Herkes görebilir** varsayılandır; hiçbir kural yoksa proje tüm kullanıcılara görünür.
- **Yalnızca seçilenler** seçilip hiçbir seçim yapılmazsa proje yine herkese açık kalır.
- Kurallar **"veya"** ile birleşir: kullanıcı seçilen rol, liderlik, takım veya kişi kurallarından herhangi birine uyuyorsa projeyi görür.
- Liderlik kuralı, o liderliğe bağlı alt liderlik ve takımları da kapsar.
- Kısıtlı projelerin adının yanında kilit simgesi görünür.

Otomatik görünürlük

- Admin ve Normal-Proje her projeyi görür.
- Kullanıcının takımına (Yönetici için yetkili takımlarına) projede planlanan kaynak varsa, proje kurala bakılmaksızın görünür.
- Kullanıcının kendisinin veya yönettiği çalışanların projede gerçekleşen kaydı varsa proje görünür.
- Gizli projelerin kaynakları toplamlarda korunur: takım kapasitesi ve Kalan Kaynak doğru hesaplanır, yalnız proje adı ve satırları gösterilmez.

8. Kaynak Planlama Raporları ve Head Count

Admin ve Yönetici içindir. Araç satırından **Kaynak Raporları** veya **Head Count** görünümü seçilir.

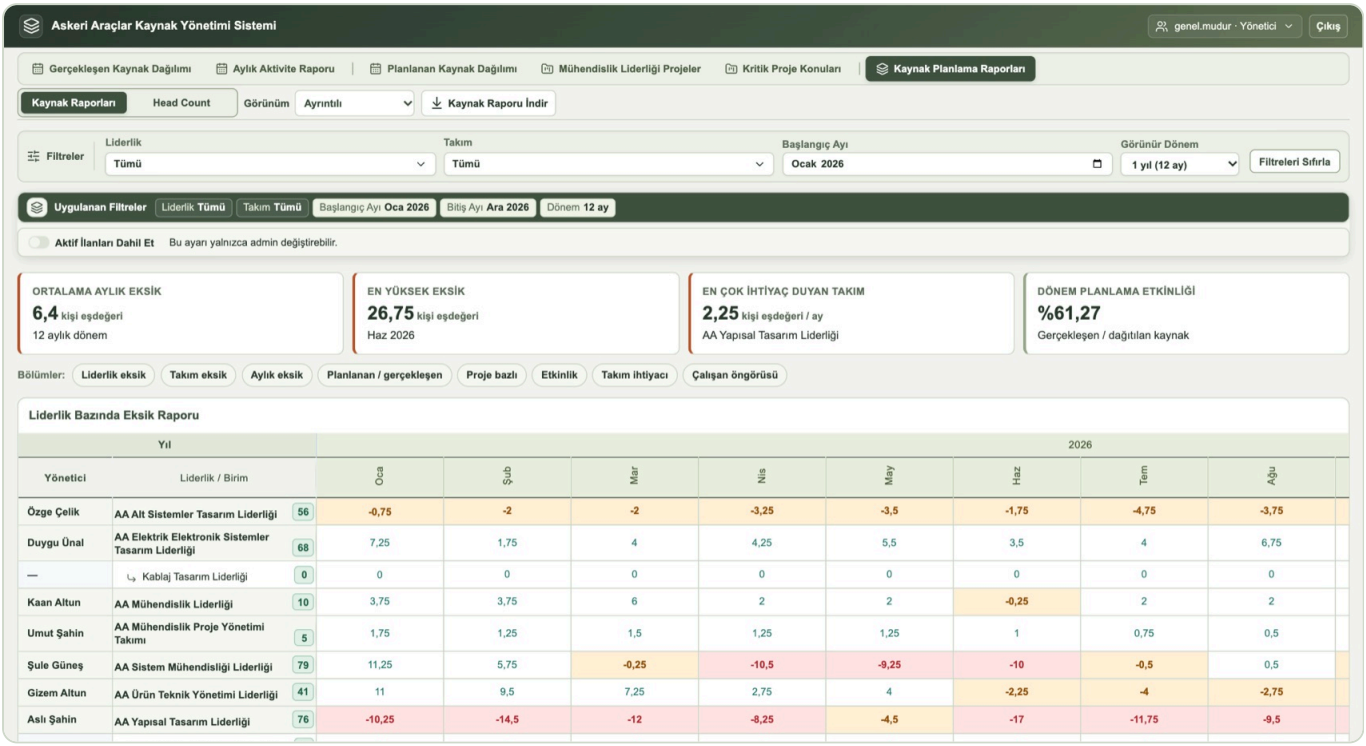


Özet kartları, bölüm kısayolları ve Liderlik Bazında Eksik Raporu.

Kaynak Raporları

- **Özet kartları:** Ortalama aylık eksik, en yüksek eksik, en çok ihtiyaç duyan takım ve dönem planlama etkinliği.
- **Bölümler:** Kısayollar ilgili rapora kaydırarak götürür.

Rapor / grafik	Nasıl okunur?
Liderlik / Takım Bazında Eksik	Birimlerin aylık kalan kaynağı; negatif değer açıktır. Alt liderlikler üst toplamın kırılımıdır, tekrar toplanmaz.
Aylık Eksik Kaynak Grafiği	Her ay için Dağıtılan – Aktif Kaynak (en az sıfır).
Planlanan / Gerçekleşen Karşılaştırma	Aylık ve proje bazlı (en fazla 10 proje) plan ile gerçekleşen karşılaştırması.
Süreç Etkinlik Grafiği	Gerçekleşen / Planlanan × 100. Plan sıfırsa oran hesaplanmaz.
Takım Bazlı İhtiyaç	Takımın aylık pozitif açıklarının seçilen ay sayısına bölünmüş ortalaması.
Çalışan Sayısı ve Öngörü	Birikimli aylık ortalama; tarihli aktif ilanlar öngörüye eklenir.

Head Count

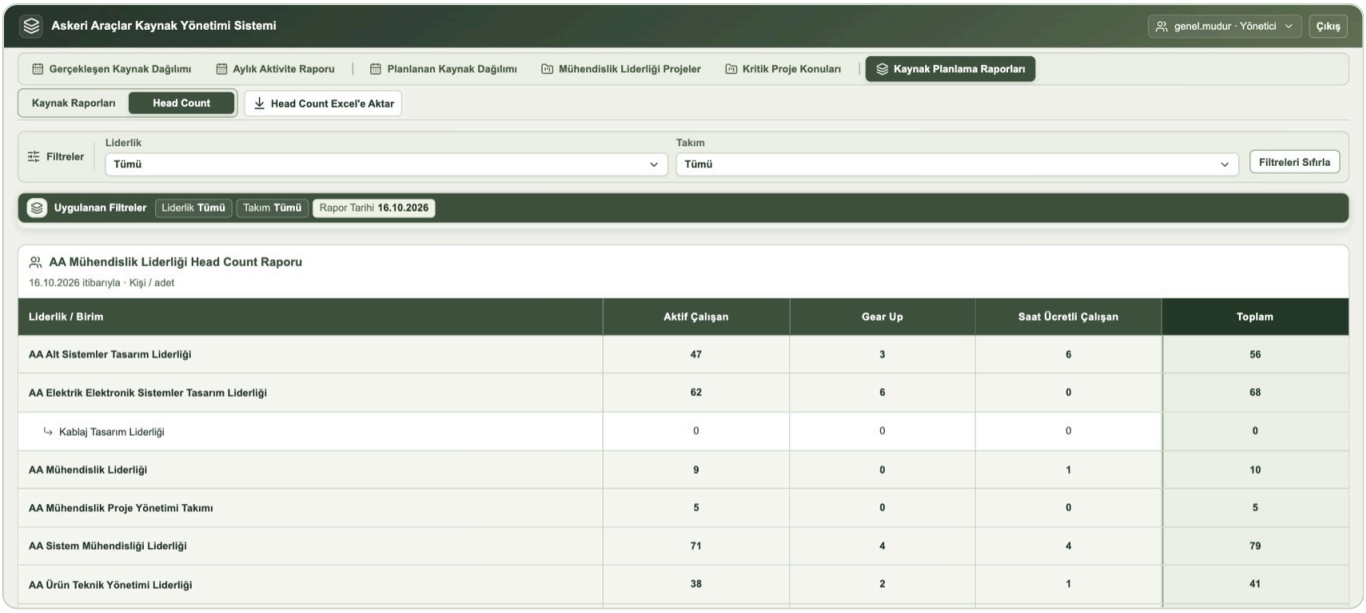


AA Mühendislik Liderliği Head Count Raporu.

- **AA Mühendislik Liderliği Head Count Raporu:** Aktif Çalışan + Gear Up + Saat Ücretli Çalışan.
- **İnsan Kültür Dönüşüm Verilerine Göre Head Count:** Aktif Çalışan, Aktif İlan ve Pasif İlan ayrı gösterilir; **Aktif İlan Dahil Head Count** = Aktif Çalışan + Aktif İlan.
- Bugünkü durumu kişi/adet olarak sayar; plana dahil seçimine bağlı değildir. **Head Count Excel'e Aktar** ile indirilir.

> **Aktif İlanları Dahil Et** (Kaynak Raporları üstünde) varsayılan olarak **kapalıdır** ve yalnız Admin değiştirebilir. Açıldığında tüm aktif ilanlar bugünkü tarihle kaynak planlamasına dahil edilir; kapatıldığında plandan çıkarılır. Bu işlem kayıtları değiştirir, yalnız görünümü değil; rapor filtresi işlemi sınırlamaz.

9. Organizasyon, çalışan ve hesap yönetimi


Yalnız Admin içindir. **Organizasyon & Çalışan & Yetki** sekmesinde **Çalışan & Yetki Tanımlama** ve **Organizasyon Yapısı** görünümleri bulunur.

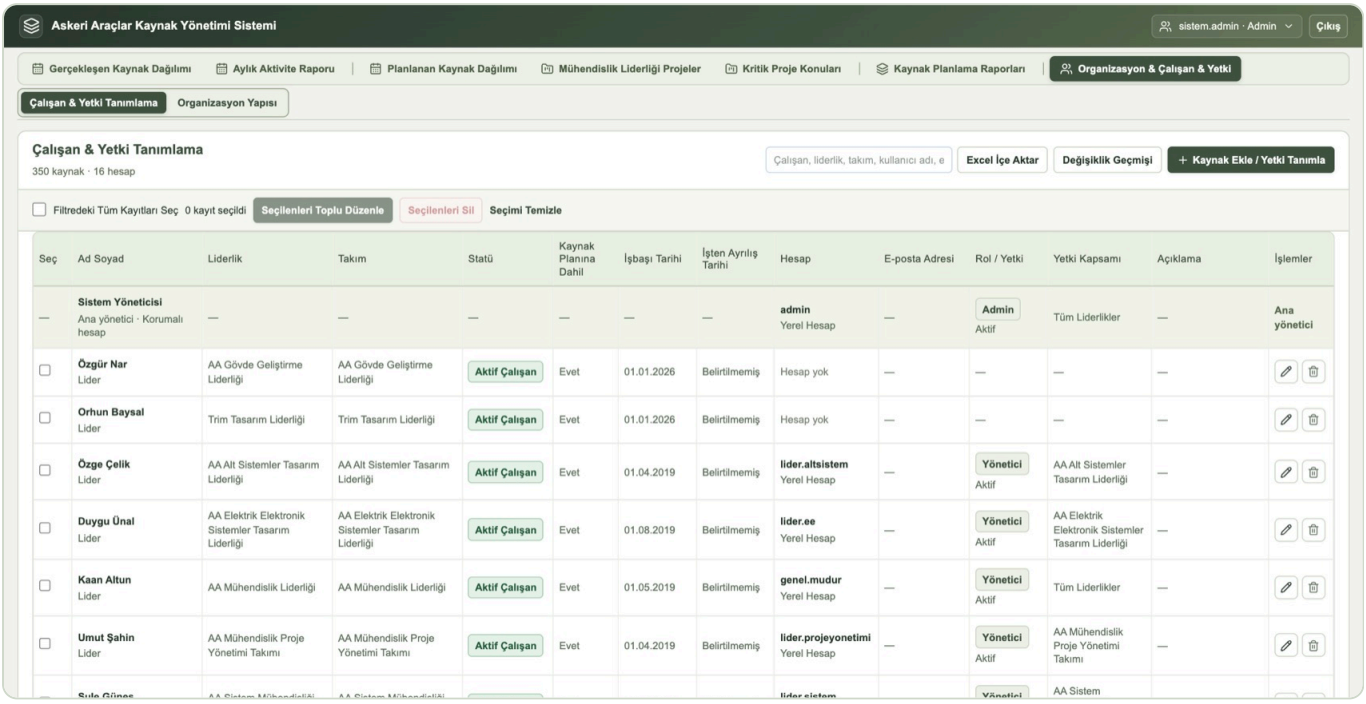

Çalışan listesi: statü, plana dahil bilgisi, hesap, rol ve yetki kapsamı. Satır sonundaki simgeler düzenler veya siler.

- Arama kutusu ad, liderlik, takım, kullanıcı adı veya e-postaya göre süzer.
- Satırlar seçilip **Seçilenleri Toplu Düzenle** veya **Seçilenleri Sil** uygulanabilir; **Filtredeki Tüm Kayıtları Seç** tüm sonucu seçer.
- Geçmişi korumak için çalışan silmek yerine statüsünü **İşten Ayrıldı** yapın; silme, gerçekleşen kayıtları da kaldırır.

Çalışan veya ilan ekleme ve hesap tanımlama

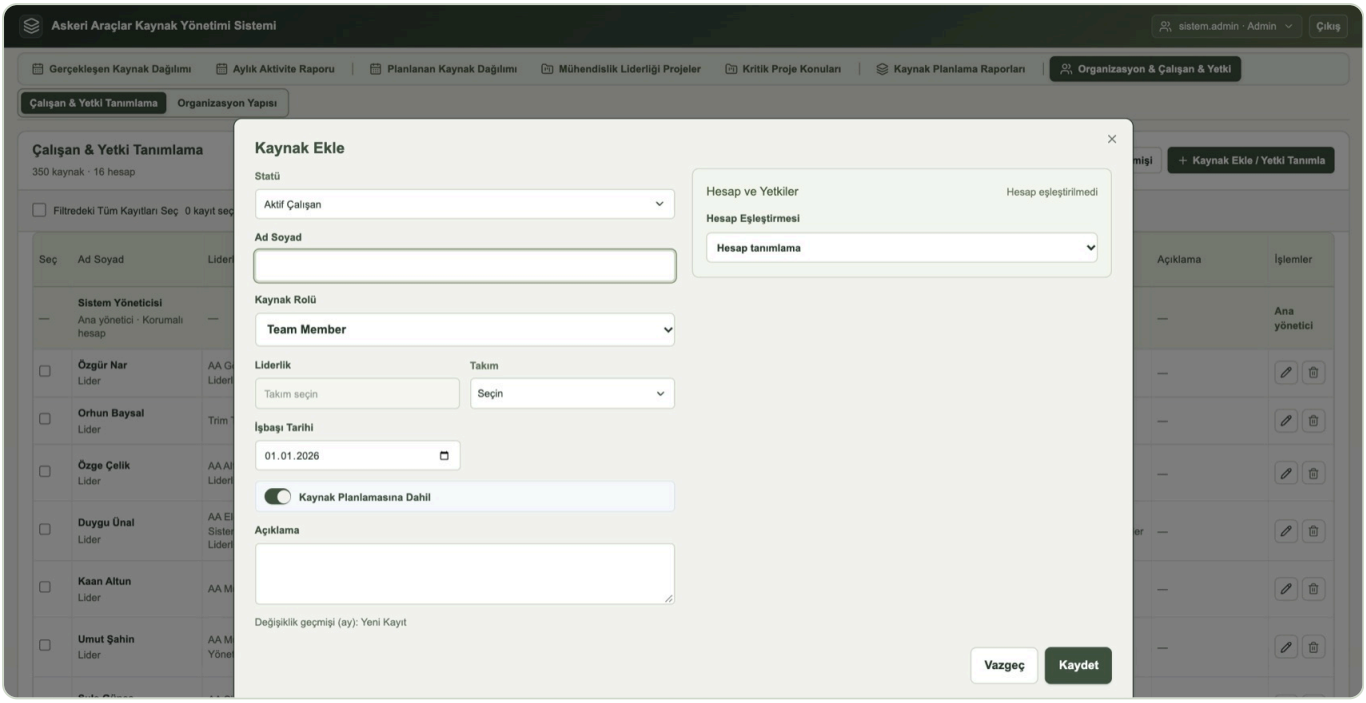


Kaynak Ekle penceresi: solda kaynak bilgileri, sağda Hesap ve Yetkiler.

1. **Kaynak Ekle / Yetki Tanımla** ile önce **Statü** seçin.
2. Ad Soyad, Kaynak Rolü, Liderlik/Takım, tarihler ve **Kaynak Planlamasına Dahil** seçimini girin. İsteğe bağlı **Açıklama** ekleyin.
3. **Hesap ve Yetkiler** bölümünde **Hesap Eşleştirmesi** alanından **Active Directory** seçin, kullanıcıyı arayıp seçin ve **Rol** belirleyin: Admin, Yönetici, Normal Kullanıcı veya Normal-Proje.
4. Yönetici için **Planlanan Kaynak Dağılımı Yetkisi** ağacından liderlik veya takım seçin. Üst liderlik seçimi alt birimleri de kapsar. **Kaydet**.
5. **Uygulama Yetkisini Kaldır**, çalışanı ve AD hesabını silmeden uygulama erişimini kapatır.

Statü	Form davranışı
Aktif Çalışan / Gear Up / SAAT Ücretli Ofis Ç.	İşbaşı tarihi zorunludur; bu yılın 1 Ocak günü önerilir.
Aktif İlan	Ad ve kaynak rolü istenmez. Dahil seçimi kapalı başlar; dahil etmek için tahmini işbaşı tarihi gerekir. İlana hesap tanımlanamaz.
Pasif İlan	Aktif kapasiteye eklenmez.
İşten Ayrıldı	İşbaşı ve ayrılış tarihleri gerekir. Eski gerçekleşen kayıtları korunur.


Organizasyon Yapısı

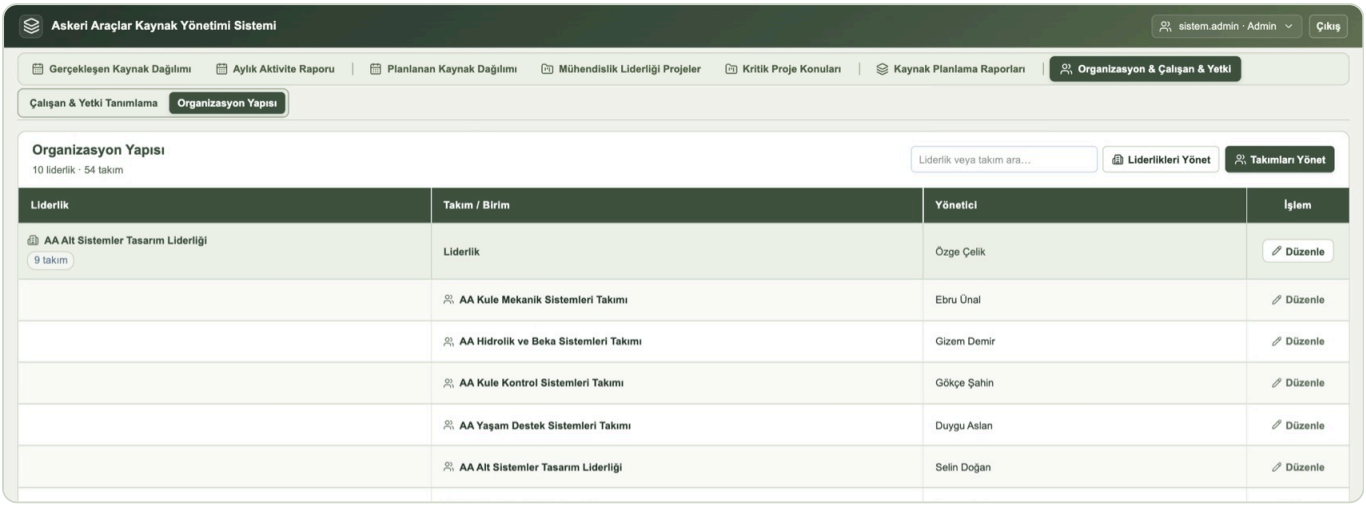

Liderlikler, bağlı takımlar ve yöneticileri.

Liderlikleri Yönet ve **Takımları Yönet** ile birimler ve aralarındaki bağlantılar düzenlenir; satırdaki **Düzenle** tek birimi açar. Yönetici adı, Lider veya Product Owner atamasından gelir. Bağlı kayıtlar silmeyi engelleyebilir.

Değişiklik Geçmişi ve Excel İçe Aktar

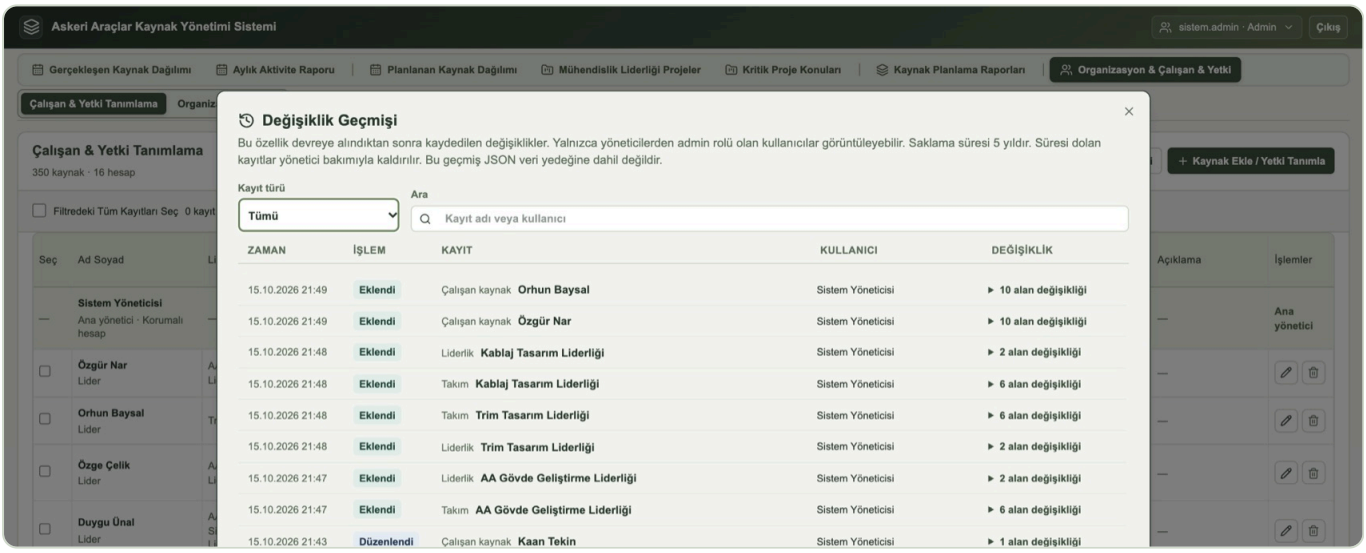

Değişiklik Geçmişi: kayıt türü ve metin filtresi, işlem türü, kullanıcı ve alan değişiklikleri.

- **Değişiklik Geçmişi** kim, ne zaman, hangi kaydı ekledi, düzenledi veya sildi gösterir. **Kayıt türü** ve **Ara** ile süzülür; satırdaki değişiklik özeti açılınca eski ve yeni değerler görünür. Kayıtlar 5 yıl saklanır ve JSON veri yedeğine dahil değildir.
- **Excel İçe Aktar** şablondan kaynak ekler; önce önizleme gösterir. Hesap veya yetki oluşturmaz.
- **Veri Yedeği İndir** (kullanıcı menüsü) şifrelenmemiş JSON planlama yedeğidir; hesap ve oturum bilgisi içermez. **Yedek Yükle** mevcut planlama verisinin yerine geçer, birleştirmez.

10. Yetki matrisi

Düzenler görüntüler ve değiştirir **Kapsamlı** yalnız belirtilen kapsamda **Görür** yalnız görüntüler — erişim yok

10.1 Ekran erişimi

Ekran	Admin	Yönetici	Normal Kullanıcı	Normal-Proje
Gerçekleşen Kaynak Dağılımı	**Düzenler** Tüm çalışanlar	**Kapsamlı** Kendisi + yetkili liderliklerdeki çalışanlar	**Kapsamlı** Yalnız kendisi	—
Aylık Aktivite Raporu	**Görür** Tümü	**Görür** Kendi liderliği ve altı	**Görür** Kendi takımı	—
Planlanan Kaynak Dağılımı	**Düzenler** Tüm takımlar	**Kapsamlı** Tüm takımları görür; verilen liderlik/takımı düzenler	—	—
Mühendislik Liderliği Projeler	**Düzenler** Tüm projeler	**Görür** Görünür projeler	**Görür** Görünür projeler	**Düzenler** Tüm projeler
Kritik Proje Konuları	**Düzenler**	**Görür**	—	**Düzenler**
Kaynak Planlama Raporları ve Head Count	**Görür** + Aktif İlanları Dahil Et	**Görür**	—	—
Organizasyon & Çalışan & Yetki	**Düzenler**	—	—	—

"Görünür projeler": proje görüntüleme yetkisine göre kullanıcının görebildiği projeler (7. bölüm).

> Yetkiler sunucu tarafında da denetlenir. Ekranda kilitli görünen bir işlem başka bir yoldan gönderilse bile reddedilir.

10.2 İşlem yetkileri

İşlem	Admin	Yönetici	Normal Kullanıcı	Normal-Proje
Gerçekleşen dağılım ve takvim				
Kendi gerçekleşen girişini yapmak	✓	✓ Çalışan kaydı eşleşmişse	✓	—
Başka çalışanın gerçekleşen girişi	✓	**Kapsamlı** Yetkili liderlik ve alt birimleri	—	—
Kişisel izin / eğitim takvimi	✓ Herkesin	**Kapsamlı** Yalnız kendi	**Kapsamlı** Yalnız kendi	—
Ortak çalışma takvimi	✓	—	—	—
Planlama				
Planlanan dağılım girişi	✓	**Kapsamlı** Verilen liderlik veya takım	—	—
Tüm Dağılımları Sıfırla	✓	—	—	—
Aktif İlanları Dahil Et	✓	—	—	—
Projeler ve kritik konular				
Proje ekleme, düzenleme, silme, sıralama	✓	—	—	✓
Aşama, başlık, not ve milestone	✓	—	—	✓
Proje görüntüleme yetkisini belirleme	✓	—	—	✓
Kritik konu düzenleme, Tamamlandı, Rapordan Çıkar	✓	—	—	✓
Yönetim				
Çalışan / ilan ekleme, düzenleme, silme, toplu düzenleme	✓	—	—	—
Hesap, rol ve yetki kapsamı tanımlama	✓	—	—	—
Liderlik ve takım yönetimi	✓	—	—	—
Excel İçe Aktar	✓	—	—	—
Değişiklik Geçmişi	✓	—	—	—
Veri Yedeği İndir / Yedek Yükle	✓	—	—	—
Ortak				
Excel'e aktarma / rapor indirme	✓ Herkes, görebildiği ekranlarda ve görebildiği verilerle			
Varsayılan sekme seçimi	✓ Herkes, kendi sekmeleri arasından			

11. Sık karşılaşılan durumlar ve sözlük

Durum	Yapılacak işlem
Sekme, çalışan veya proje görünmüyor	Rolünüzü (sağ üst), filtreleri ve proje görüntüleme yetkisini kontrol edin. Gerekirse Admin'den rol veya kapsam isteyin.
Hücreye giriş yapılamıyor	Yetki kapsamını, proje dönemini ve gerçekleşende gelecek ay kısıtını kontrol edin.
Tabloda boş satır çok	**Sadece veri olanlar** anahtarını açın. Anahtar her açılışta kapalı başlar.
Dağılım sınırı uyarısı	Kişinin o aydaki tüm proje saatlerini, eğitim ve izinlerini birlikte kontrol edin.
"Kayıt başka kullanıcı tarafından değiştirildi"	Sayfayı yenileyin, güncel değeri kontrol edip yeniden girin.
Bağlantı kesildi / sonuç belirsiz	Aynı işlemi hemen tekrarlamayın; sayfayı yenileyip son durumu kontrol edin.
Giriş yapılamıyor	Tekrarlayan denemeleri durdurun; ekran adı, saat ve hata mesajını IT'ye iletin.

Kısa sözlük

Kişi eşdeğeri	Planlama birimi; 1 = bir tam zamanlı kaynak.
Aktif / Dağıtılan / Kalan Kaynak	Kullanılabilir kaynak / projelere planlanan / aradaki fark (negatifse açık).
Aşama	Projenin ay bazındaki evresi (örneğin Detay Tasarım, Prototip Üretimi); renkli kutuyla gösterilir.
Milestone	Tek tarihli kilometre taşı; baklava simgesiyle gösterilir.
Head Count	Kişi/adet sayısı.
AD	Kurum kullanıcı dizini (Active Directory).
